

令和6年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果(B等級)

○調査対象工事

北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事の内、請負金額1,300万円以上4,000万円未満(建築は300万円以上4,000万円未満)でかつ、令和6年4月1日～令和7年3月31日までに完成し採算が把握できる工事。


※採算性には本社経費を含めたもの

○対象企業 会員企業のうち県ランク土木B級または、建築B等級 194社

○回答企業数 128社 回答率 66.0%

○調査期間 令和7年6月2日～7月11日


③発注者別の採算状況(267件、128社)

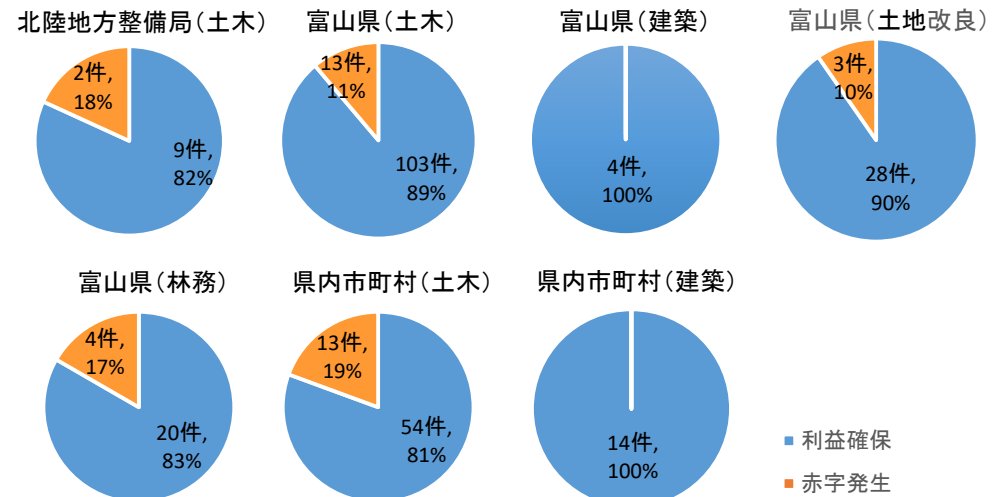


④赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)



①調査対象工事の状況(267件、128社)

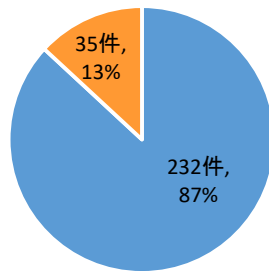


②赤字工事の内訳(35件、21社)

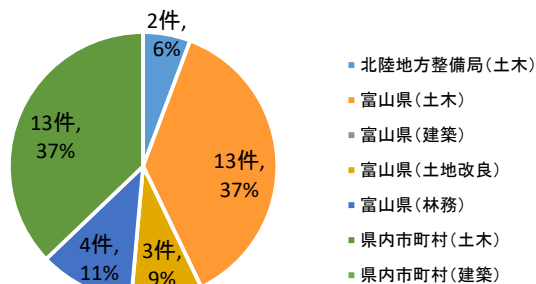


令和6年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)

北陸地方整備局(土木) 利益確保9件(82%) 赤字発生2件(18%)

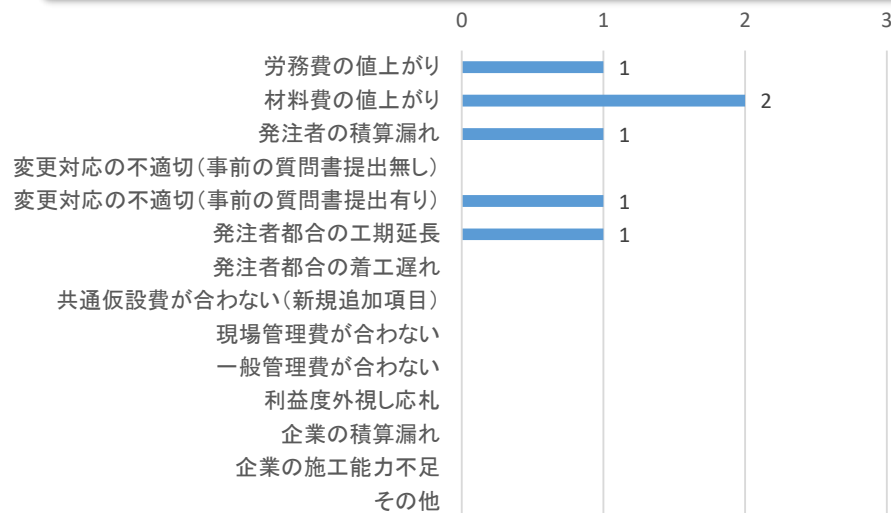


富山県(土木) 利益確保103件(89%) 赤字発生13件(11%)

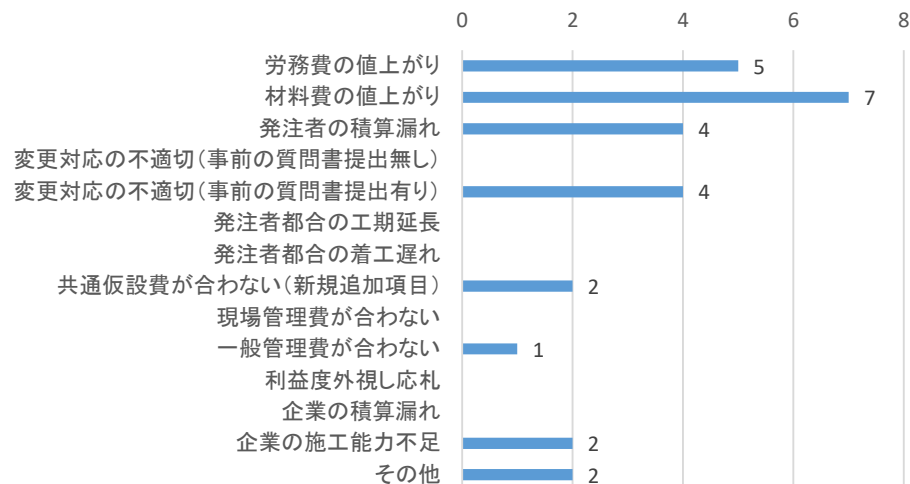


富山県(土地改良)利益確保28件(90%) 赤字発生3件(10%)



富山県(林務) 利益確保20件(83%) 赤字発生4件(17%)

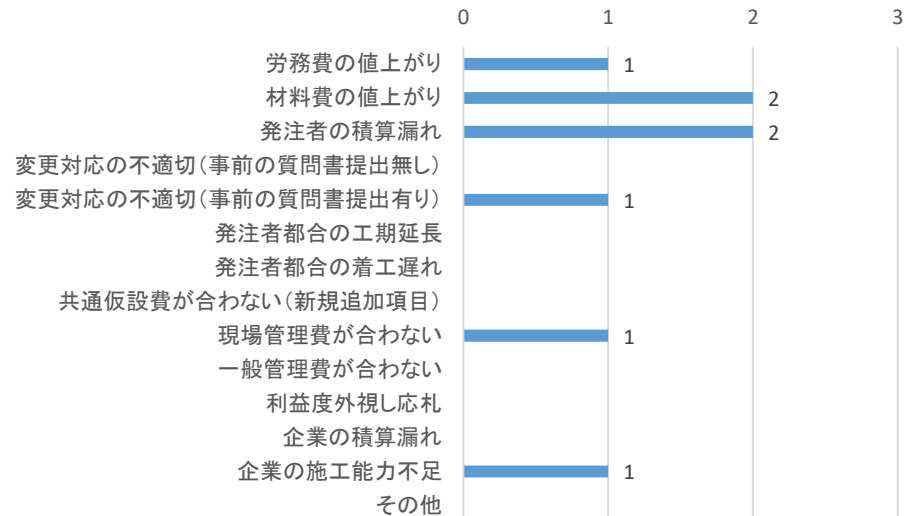

県内市町村(土木) 利益確保54件(81%) 赤字発生13件(19%)

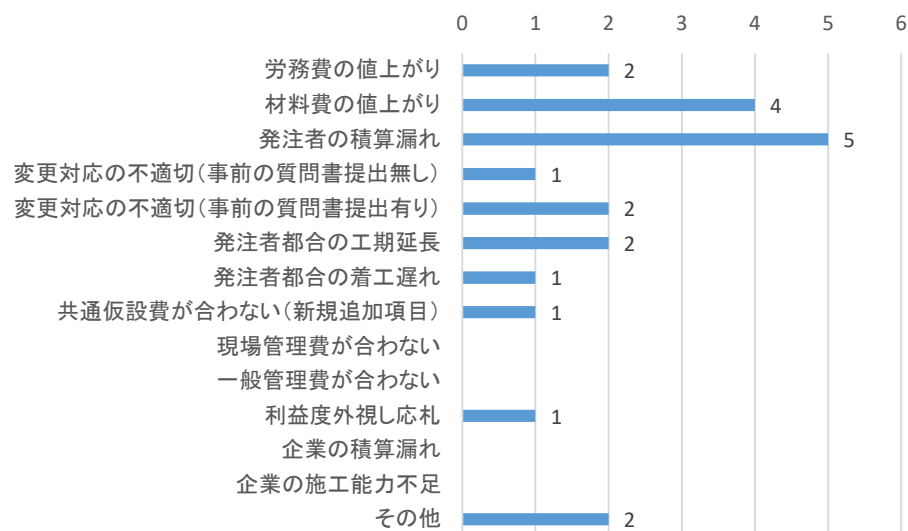

赤字工事の主な発生理由(その他)

【富山県(土木)】

- ・土工の歩掛が合わない。
- ・入札前の質問の回答が違っていたため。
- ・機材、事務費、リース代が値上がりしている。

【富山県(土地改良)】

- ・土地改良事業で現場の管理ポイントが多く、現場管理費に影響し一般管理費を食い潰す結果となった。
- ・全てが値上がりしている。

【市町村(土木)】

- ・事前の設計と齟齬があり、設計変更がやむを得ない状況であったため。
- ・仮設(足場)、橋梁点検車の費用が実態と乖離している。
- ・工事期間中に別工事が発注されたため中止も無く待たされた。

発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和5年度と令和6年度の比較）

①調査対象工事の状況（令和5年度 363件 134社、令和6年度 267件 128社）

調査対象工事


・北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事のうち、請負金額2,500万以上（建築3,000万円以上）

<令和5年度対象工事期間>


令和5年4月1日～令和6年3月31日

<令和6年度対象工事期間>


令和6年4月1日～令和7年3月31日





②赤字工事の内訳（令和5年度 41件 30社、令和6年度 35件 21社）

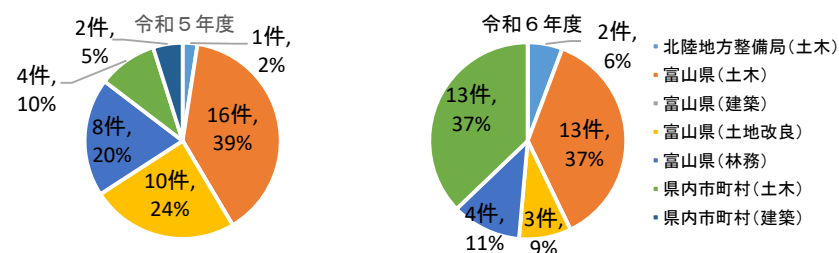

③発注者別の採算状況

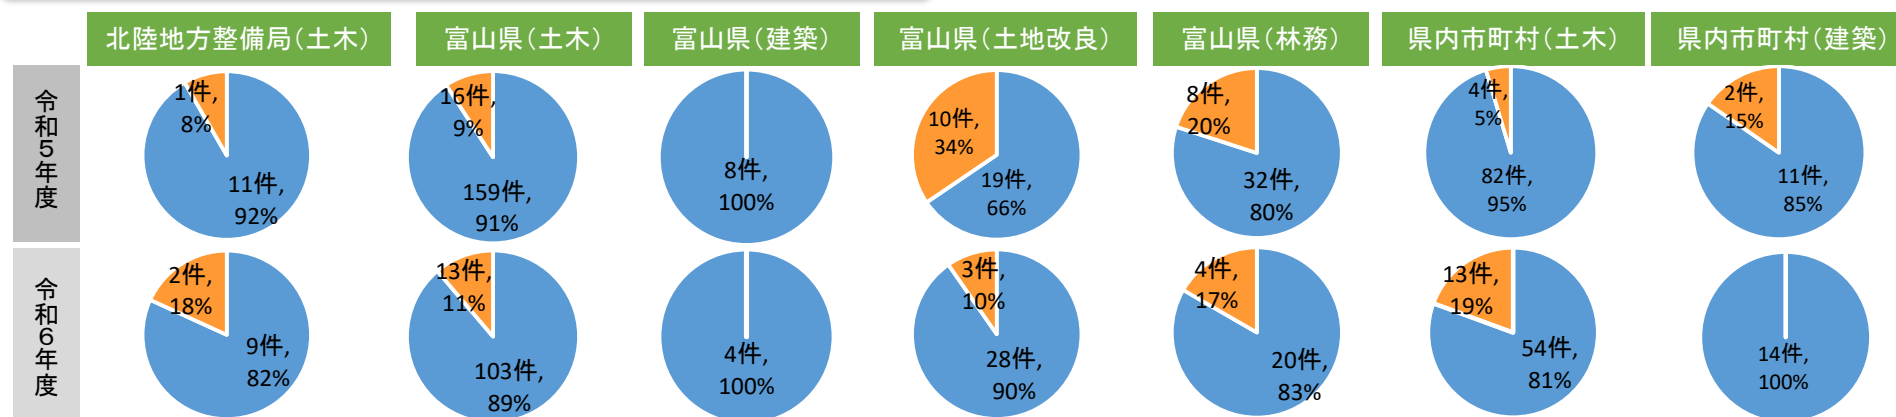


④赤字工事の主な発生理由（3つまで回答可）

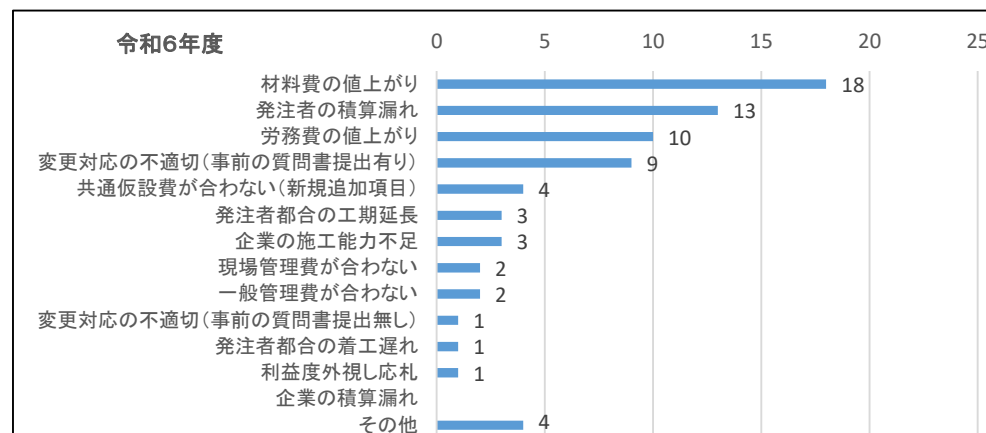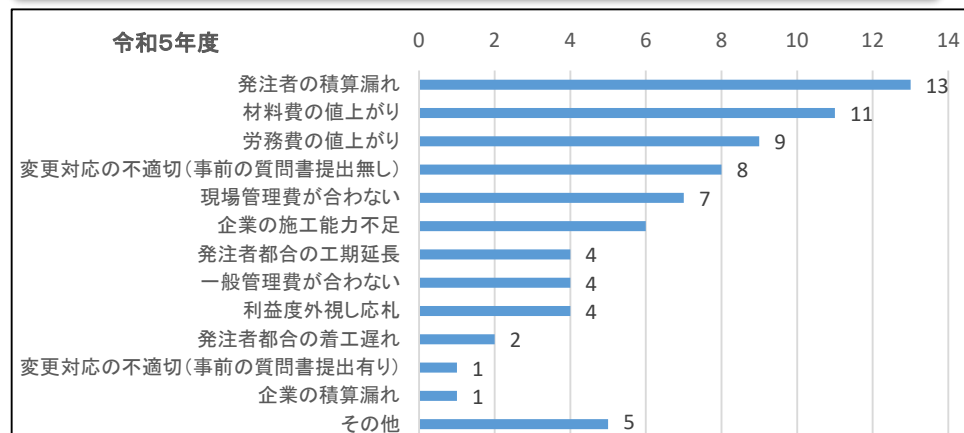


令和6年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果(呉東呉西の比較)


①調査対象工事の状況(呉東 127件、66社、 呉西 140件、65社)

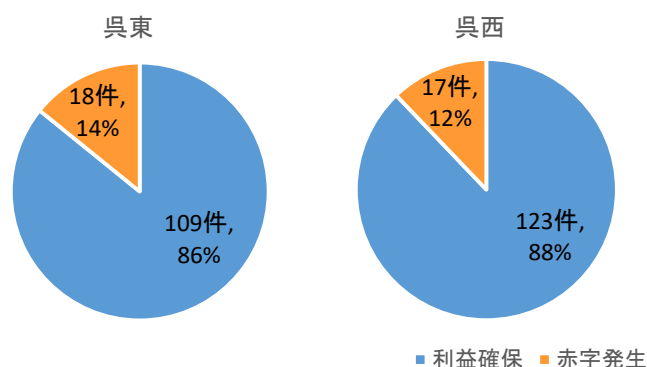


③発注者別の採算状況(267件、128社)

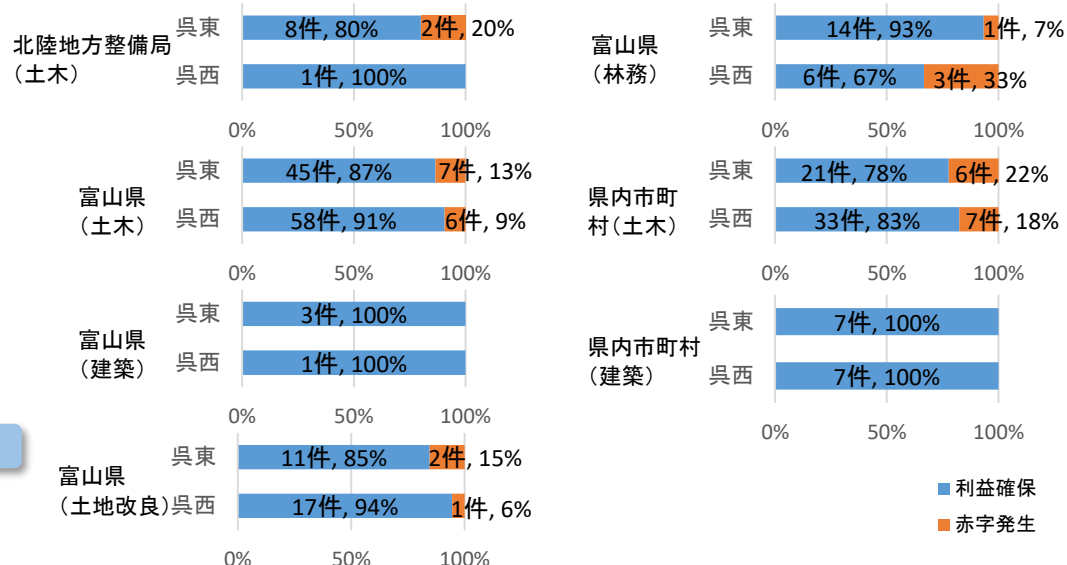

②赤字工事の内訳(呉東 18件、10社、 呉西 17件、11社)

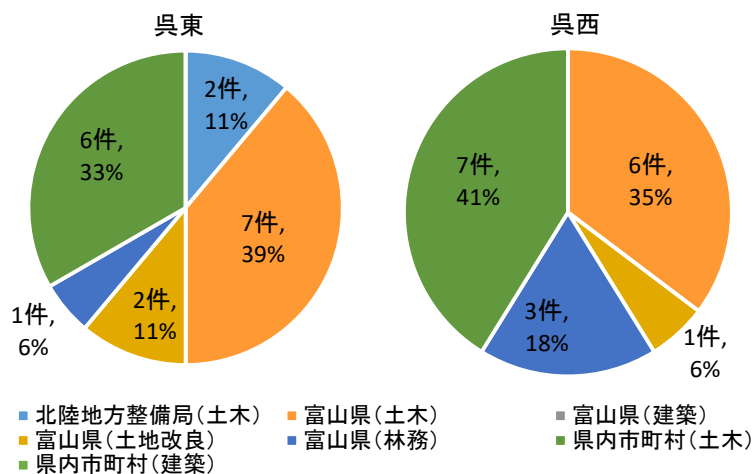


④赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)

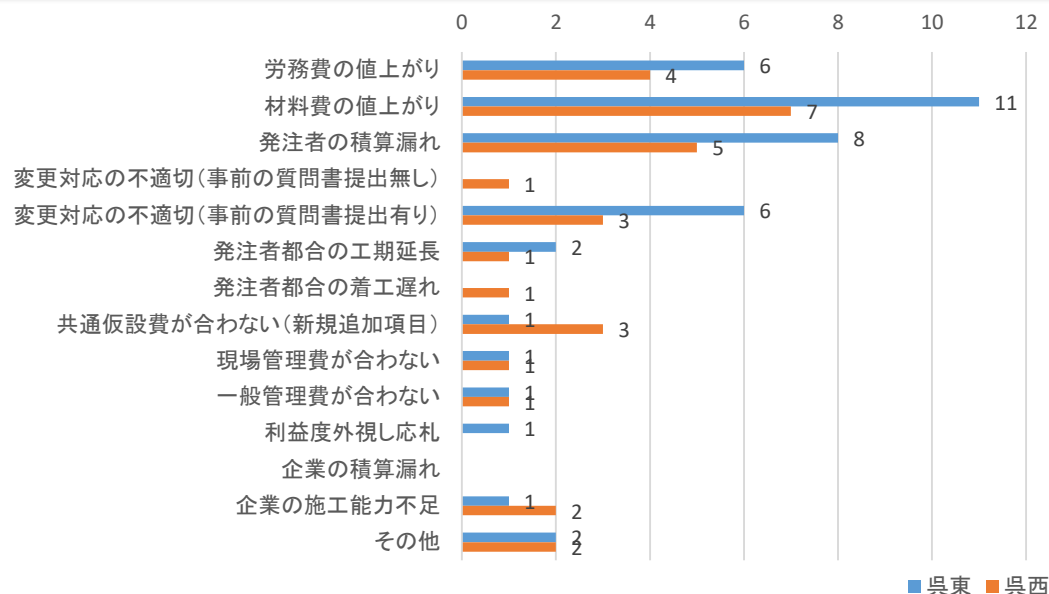


令和6年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)(呉東呉西の比較)


北陸地方整備局(土木) 赤字発生 呉東 2件、呉西 0件

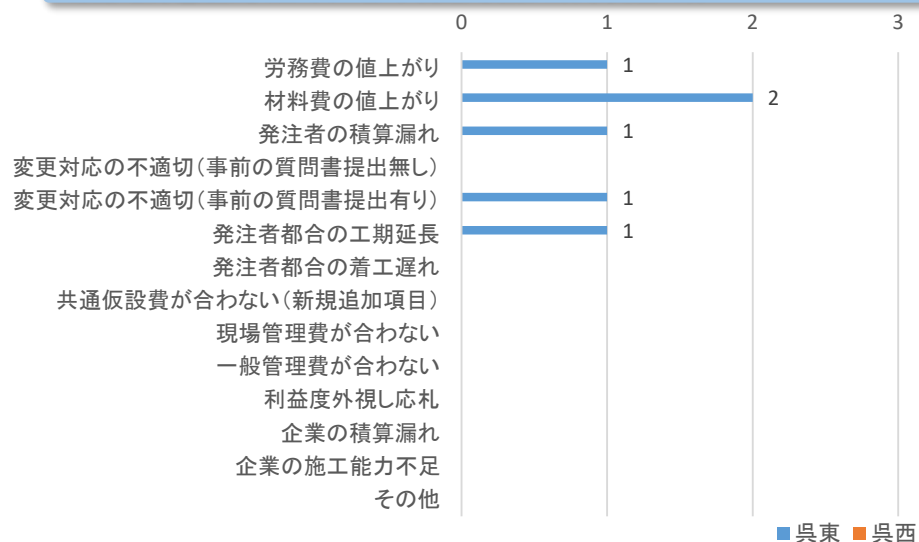


富山県(土木) 赤字発生 呉東 7件、呉西 6件

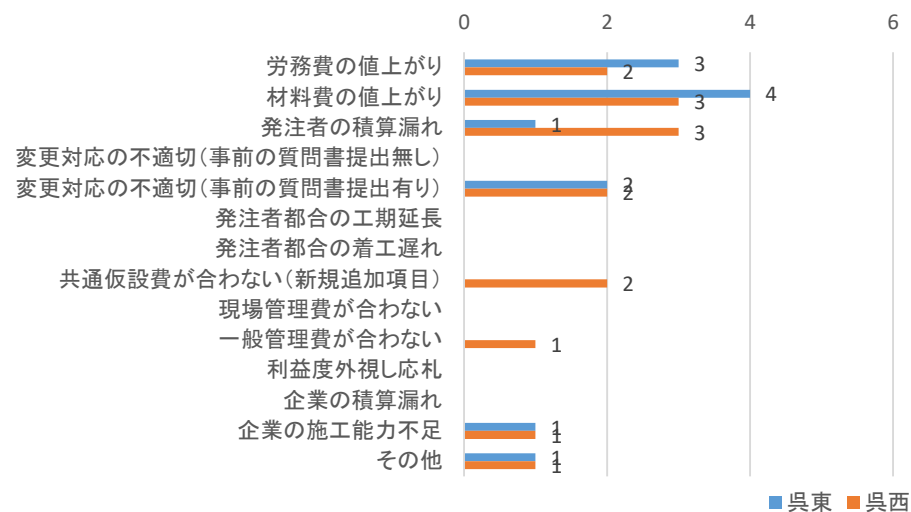


富山県(土地改良) 赤字発生 呉東 2件、呉西 1件

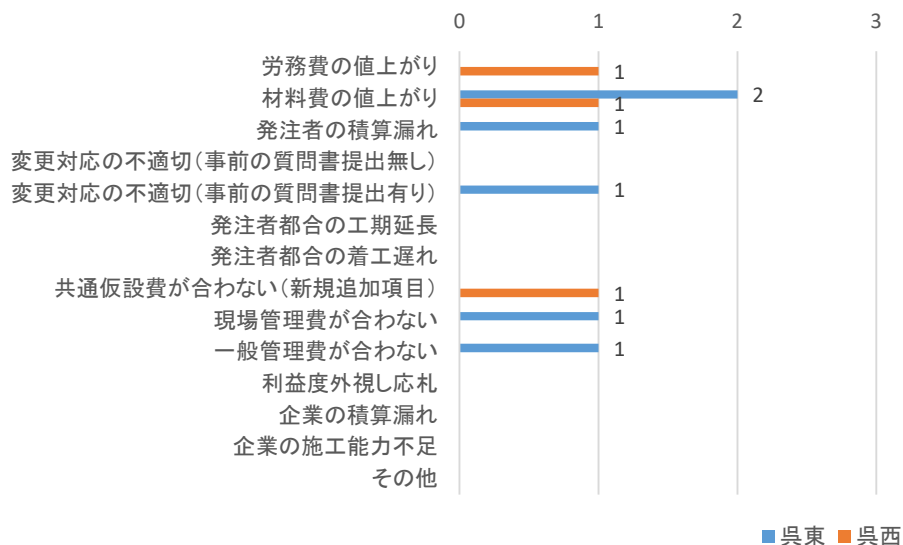

富山県(林務) 赤字発生 呉東 1件、呉西 3件

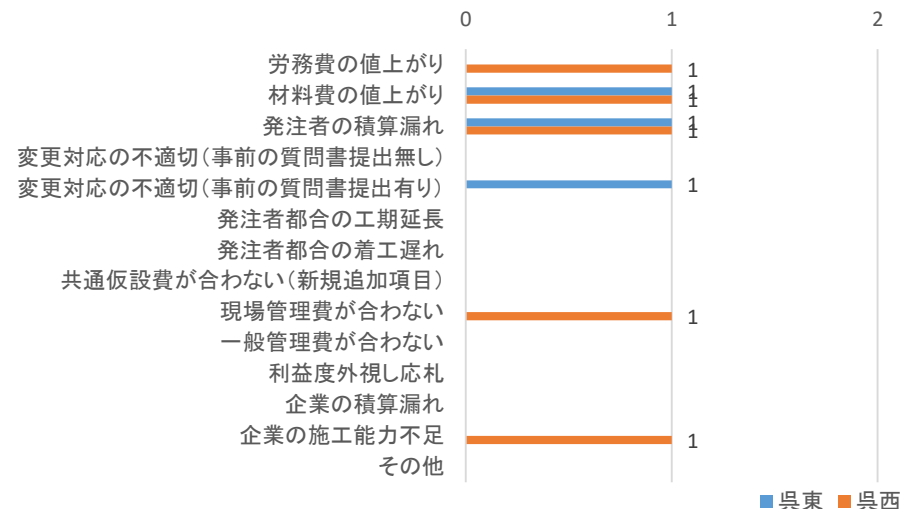


県内市町村(土木) 赤字発生 呉東 6件、呉西 7件

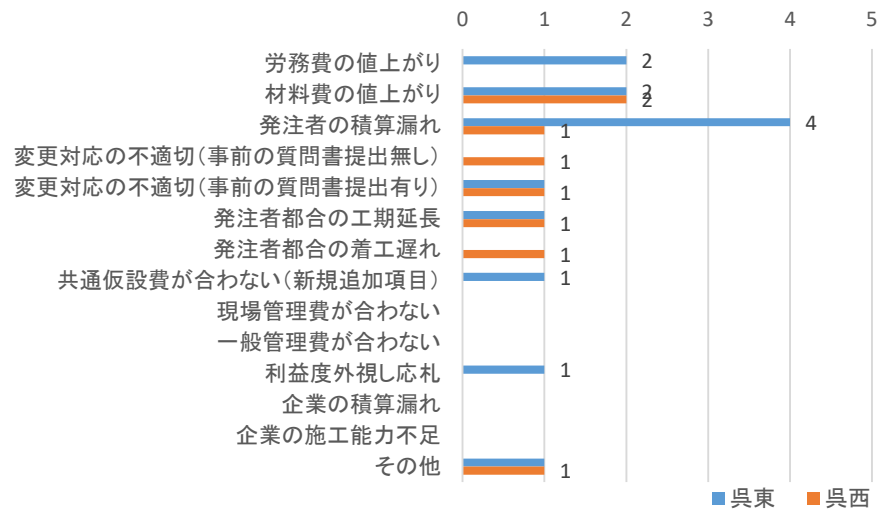


発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和5年度と令和6年度の呉東呉西比較）

①発注者別の採算状況


北陸地方整備局（土木）

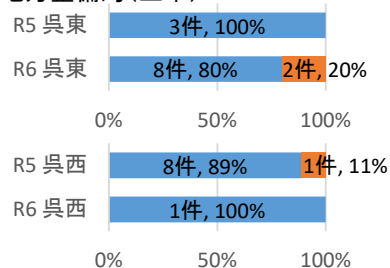


富山県（土木）

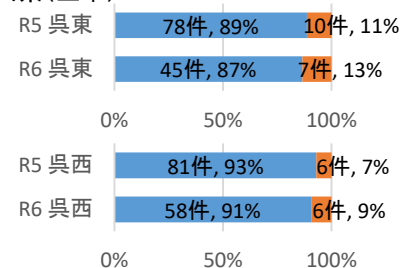


富山県（建築）

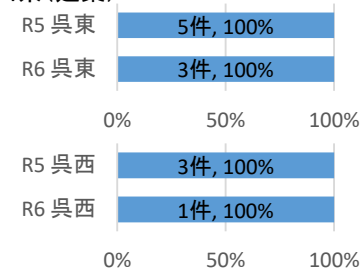


富山県（土地改良）

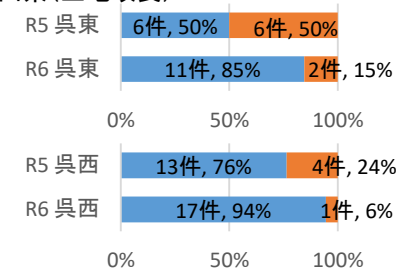


富山県（林務）

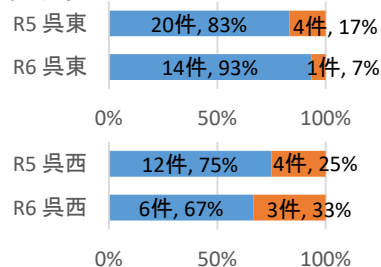

県内市町村（土木）

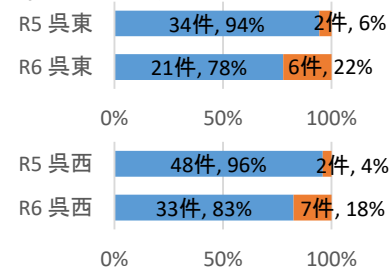

県内市町村（建築）

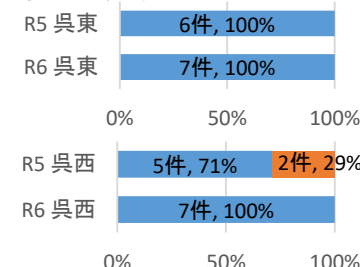


■ 利益確保
■ 赤字発生

②赤字工事の主な発生理由（3つまで回答可）


労務費の値上がり




材料費の値上がり




発注者の積算漏れ




変更対応の不適切




発注者都合の工期延長




発注者都合の着工遅れ




現場管理費が合わない




一般管理費が合わない




利益度外視し応札



企業の積算漏れ



企業の施工能力不足



その他

