

令和7年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果(B等級)

○調査対象工事

北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事の内、請負金額1,300万円以上4,000万円未満(建築は300万円以上4,000万円未満)でかつ、令和7年4月1日～令和8年3月31日までに完成し採算が把握できる工事。


※採算性には本社経費を含めたもの

○対象企業 会員企業のうち県ランク土木B級または、建築B等級 201社


○回答企業数 141社 回答率 70.1%

○調査期間 令和8年6月1日～7月3日


③発注者別の採算状況(300件、141社)

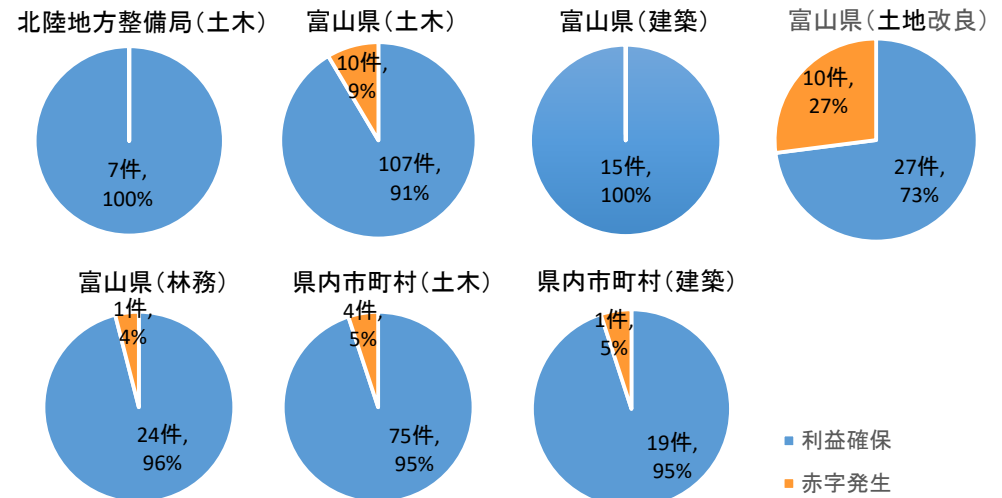


④赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)

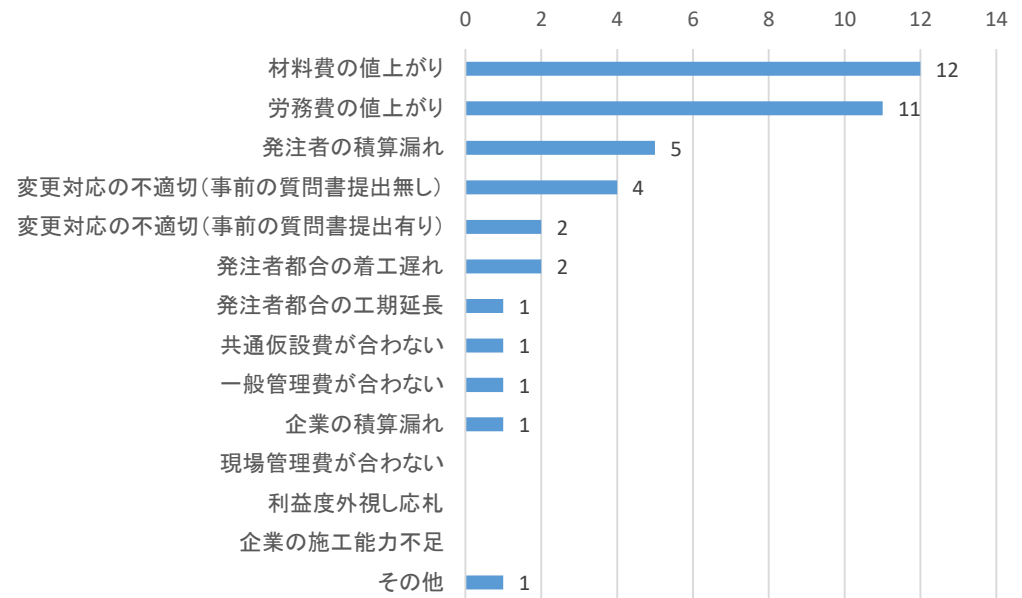

①調査対象工事の状況(300件、141社)

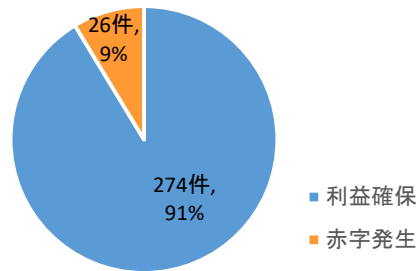


②赤字工事の内訳(26件、19社)

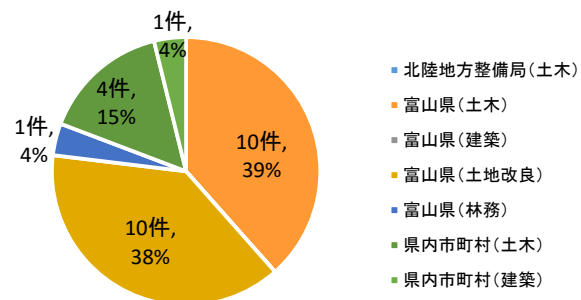


令和7年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)


富山県(土木) 利益確保 107件(91%) 赤字発生 10件(9%)

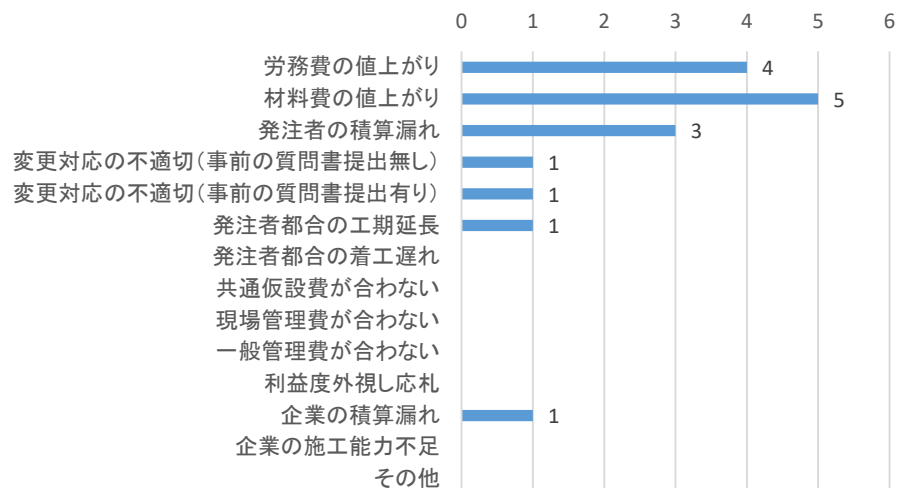


富山県(土地改良) 利益確保 27件(73%) 赤字発生 10件(27%)

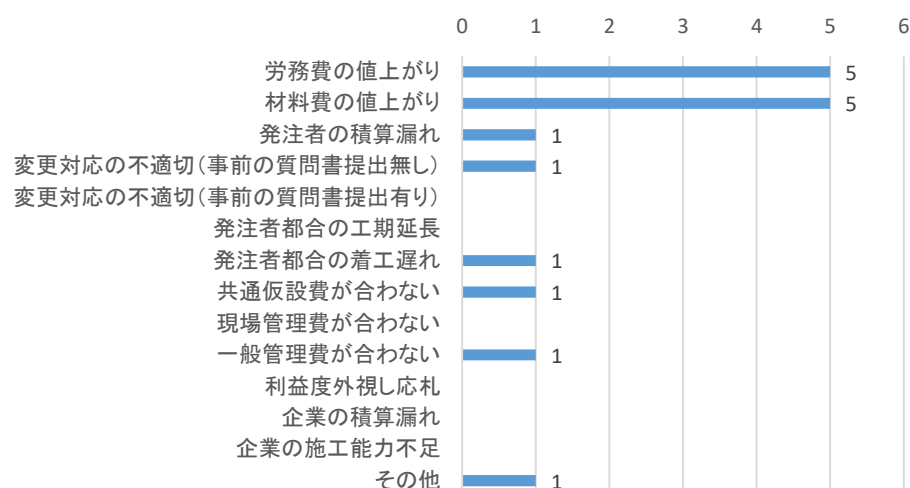


富山県(林務) 利益確保 24件(96%) 赤字発生 1件(4%)

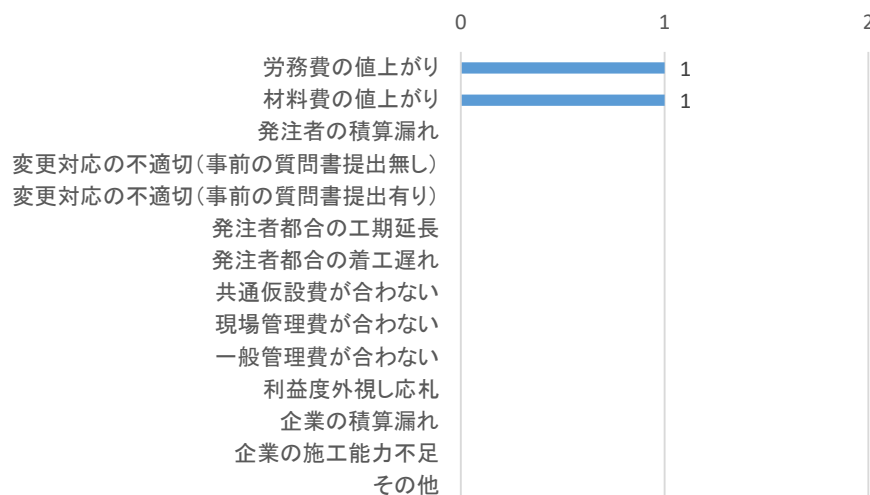

県内市町村(土木) 利益確保 75件(95%) 赤字発生 4件(5%)

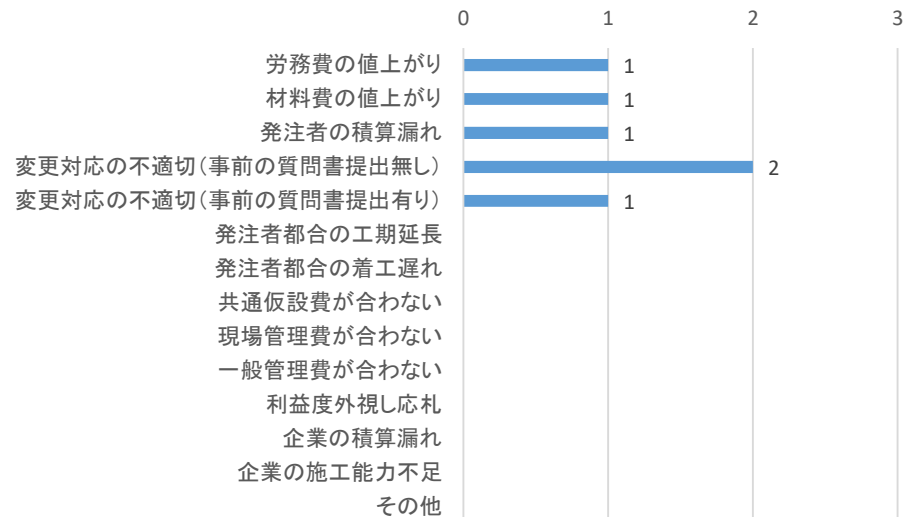

県内市町村(建築) 利益確保 19件(95%) 赤字発生 1件(5%)

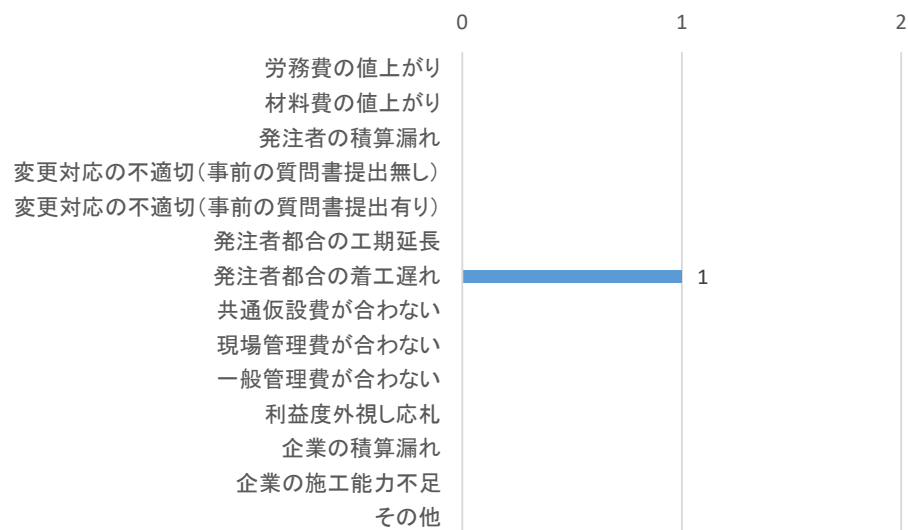

赤字工事の主な発生理由(その他)

【富山県(土木)】

- ・砂防工事、仮設工、雨による増水によりポンプ燃料費増大。

【富山県(土地改良)】

- ・土地改良系の工事は経費が他の工事種別よりも経費がかかるため。
- ・発注が7月末で着工が遅れ経費がかさんだ。発注が遅く11月～3月(冬季)仕事にならず経費が膨らんだ。

【市町村(土木)】

- ・事前の設計と齟齬があり、設計変更がやむを得ない状況であったため。
- ・仮設(足場)、橋梁点検車の費用が実態と乖離している。
- ・工事期間中に別工事が発注されたため中止も無く待たされた。

発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和6年度と令和7年度の比較）

①調査対象工事の状況（令和6年度 267件 128社、令和7年度 300件 141社）

調査対象工事


・北陸地方整備局、富山県及び県内市町村発注工事のうち、請負金額2,500万以上（建築3,000万円以上）

<令和6年度対象工事期間>


令和6年4月1日～令和7年3月31日

<令和7年度対象工事期間>


令和7年4月1日～令和8年3月31日





②赤字工事の内訳（令和6年度 35件 21社、令和7年度 26件 19社）

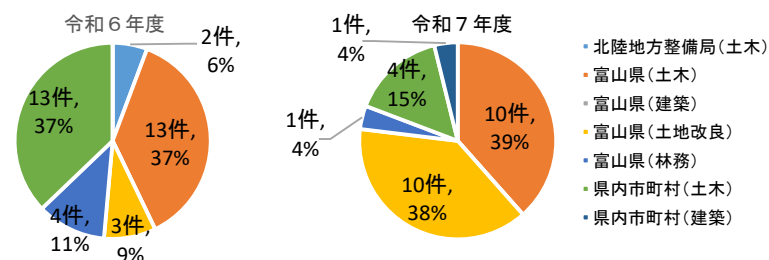

③発注者別の採算状況

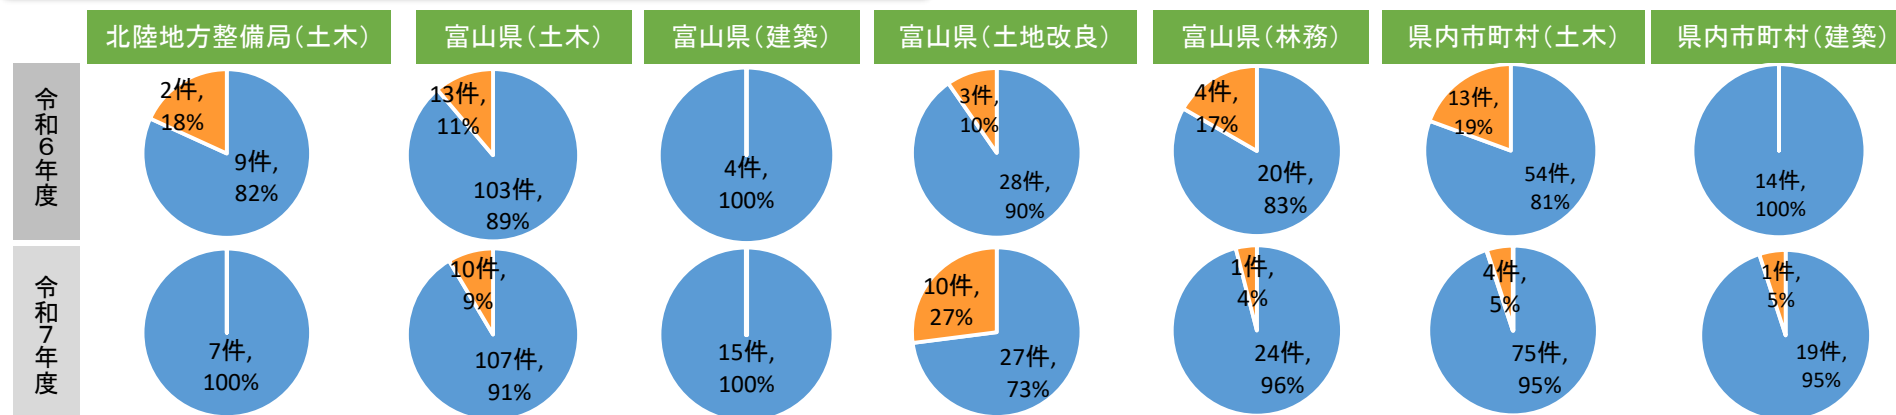


④赤字工事の主な発生理由（3つまで回答可）

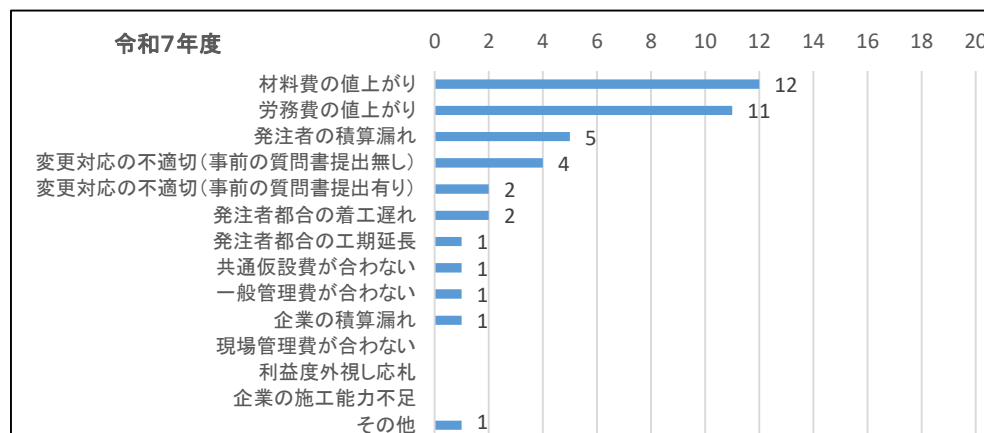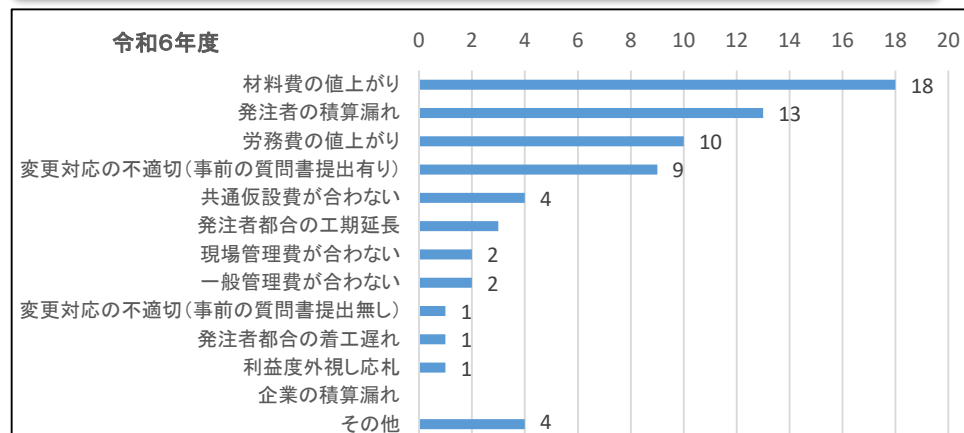


令和7年度 発注者別工事採算性に関するアンケート結果(呉東呉西の比較)


①調査対象工事の状況(呉東 150件、78社、 呉西 150件、63社)

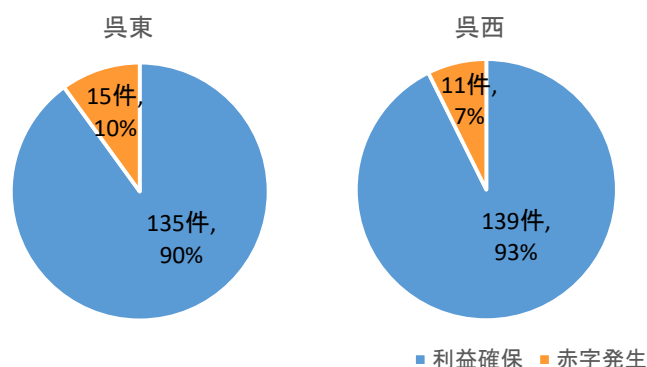


③発注者別の採算状況(300件、141社)

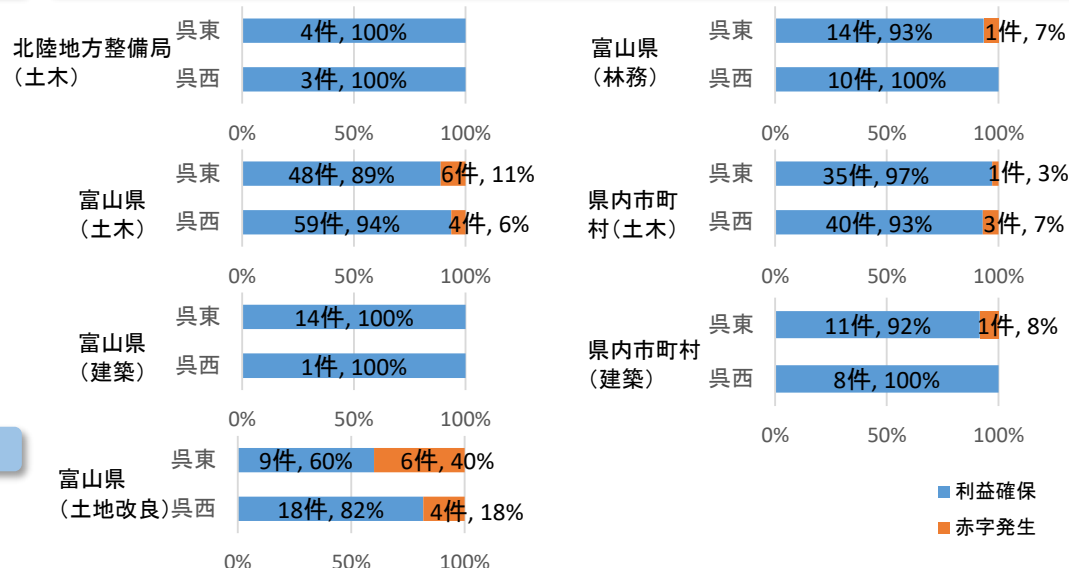

②赤字工事の内訳(呉東 15件、12社、 呉西 11件、7社)

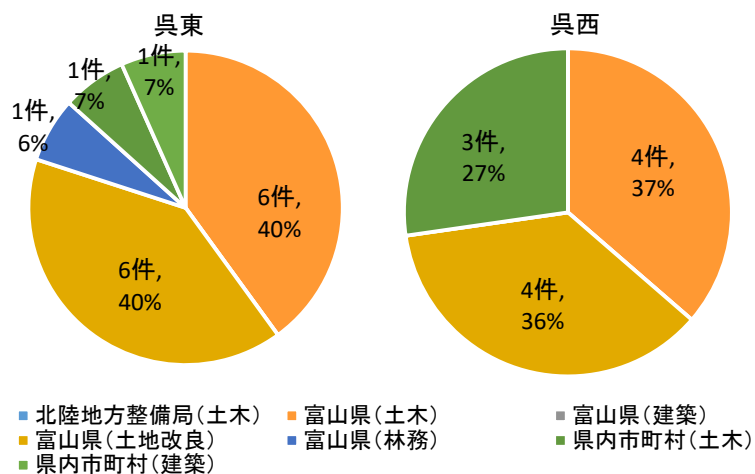

④赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)

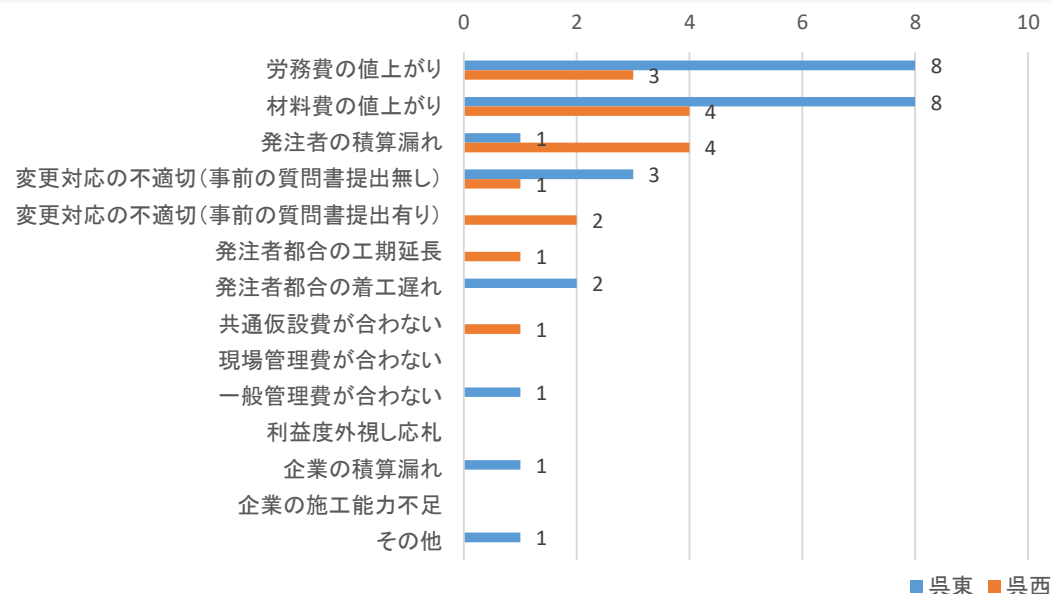


令和7年度 発注者別赤字工事の主な発生理由(3つまで回答可)(呉東呉西の比較)


富山県(土木) 赤字発生 呉東 6件、呉西 4件




富山県(土地改良) 赤字発生 呉東 6件、呉西 4件

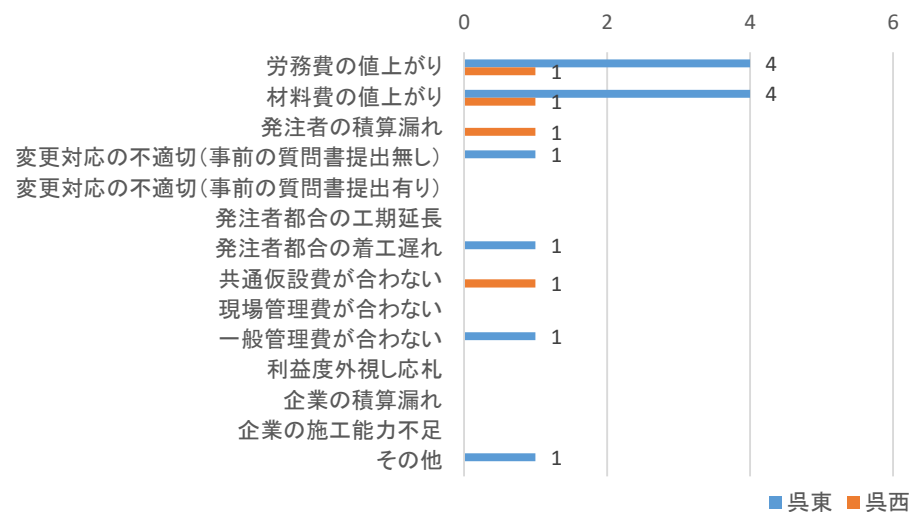


富山県(林務) 赤字発生 呉東 1件、呉西 0件

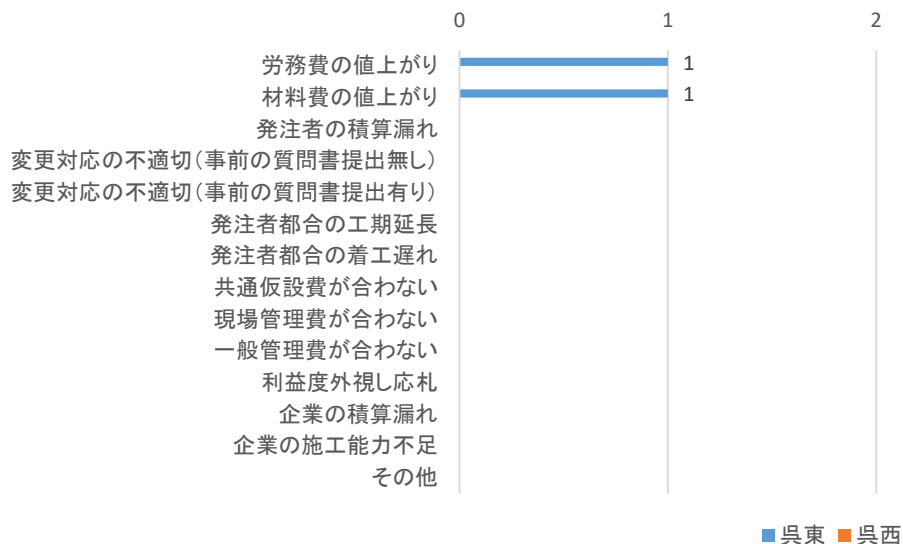

県内市町村(土木) 赤字発生 呉東 1件、呉西 3件

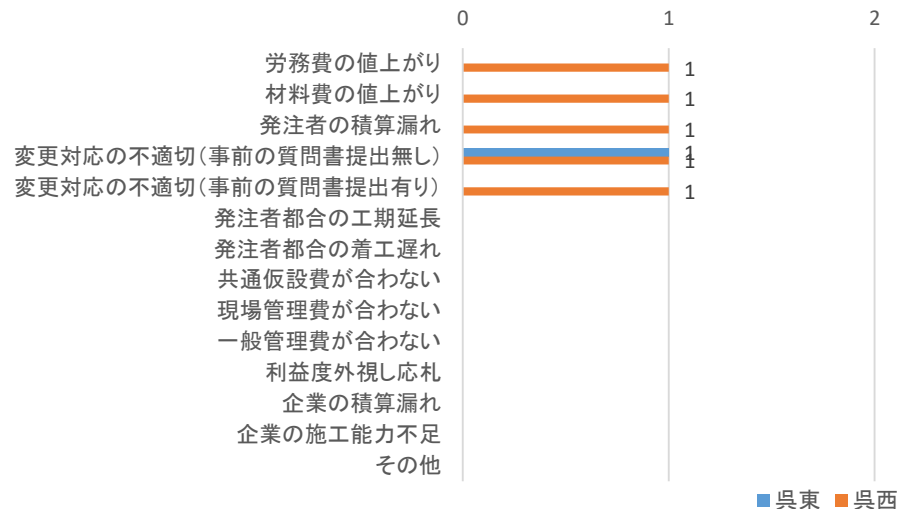


県内市町村(建築) 赤字発生 呉東 1件、呉西 0件

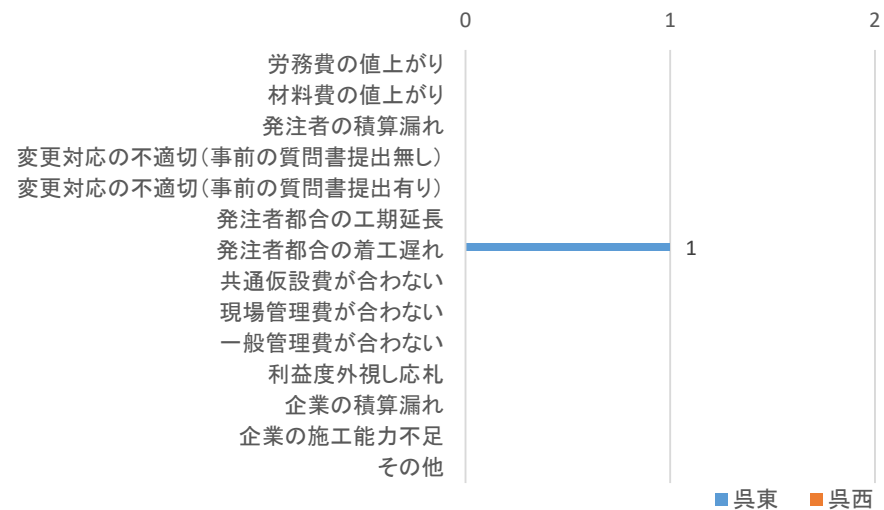


発注者別工事採算性に関するアンケート結果（令和6年度と令和7年度の呉東呉西比較）

①発注者別の採算状況


北陸地方整備局（土木）

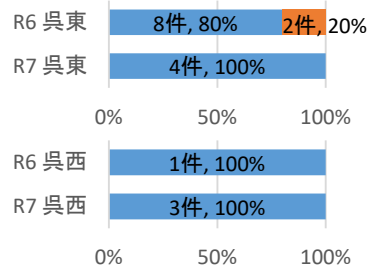


富山県（土木）

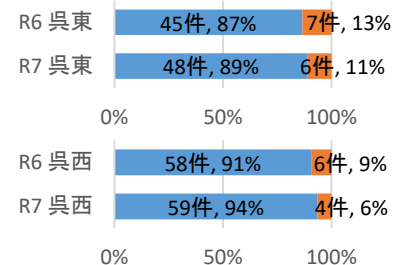


富山県（建築）

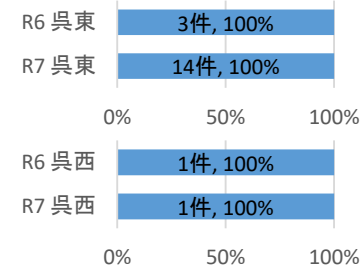


富山県（土地改良）

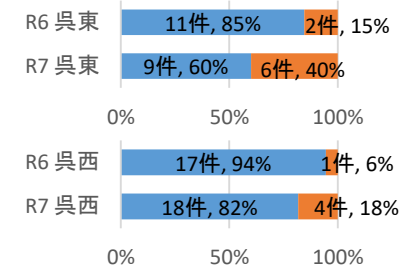


富山県（林務）

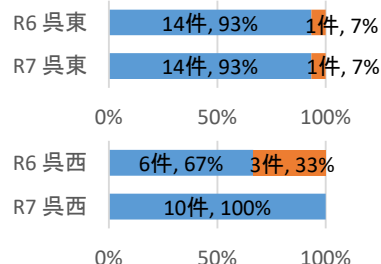

県内市町村（土木）

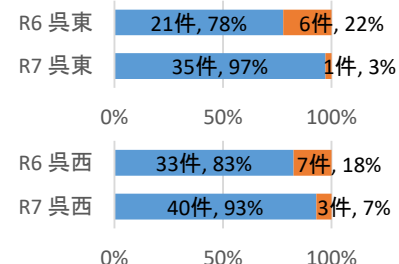


県内市町村（建築）

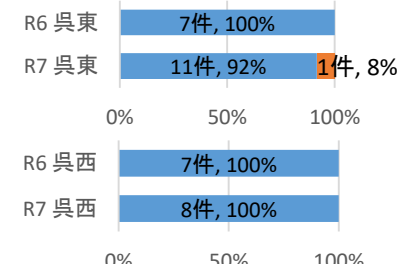


■ 利益確保
■ 赤字発生

②赤字工事の主な発生理由（3つまで回答可）


労務費の値上がり




材料費の値上がり




発注者の積算漏れ




変更対応の不適切




発注者都合の工期延長



発注者都合の着工遅れ




共通仮設費が合わない




現場管理費が合わない




一般管理費が合わない



利益度外視し応札



企業の積算漏れ



企業の施工能力不足

